

【道路事業(改築)】 主要地方道 山形山寺線 高瀬川橋工区

6-1

やまがたやまでら

たかせがわばし

至 天童市

位置図



現況写真
(令和6年3月撮影)

主要地方道 山形山寺線 高瀬川橋工区
延長 500.0m(うち橋梁部88.0m)
幅員 6.5(9.0)[16.0]m

至山形市街

仮設橋(供用中)

(主)山形山寺線

至天童市

新橋架設

村山高瀬川


(一)東山七浦線

現在は新橋橋面舗装を完了し、今年度仮橋撤去着手予定
(令和6年5月29日撮影)

計画平面図

- R05年度迄工事完了
- R06年度工事実施
- R07年度以降工事予定

主要地方道 山形山寺線 高瀬川橋工区
L=500m W=6.5(9.0)[16.0]m C=2,023百万円

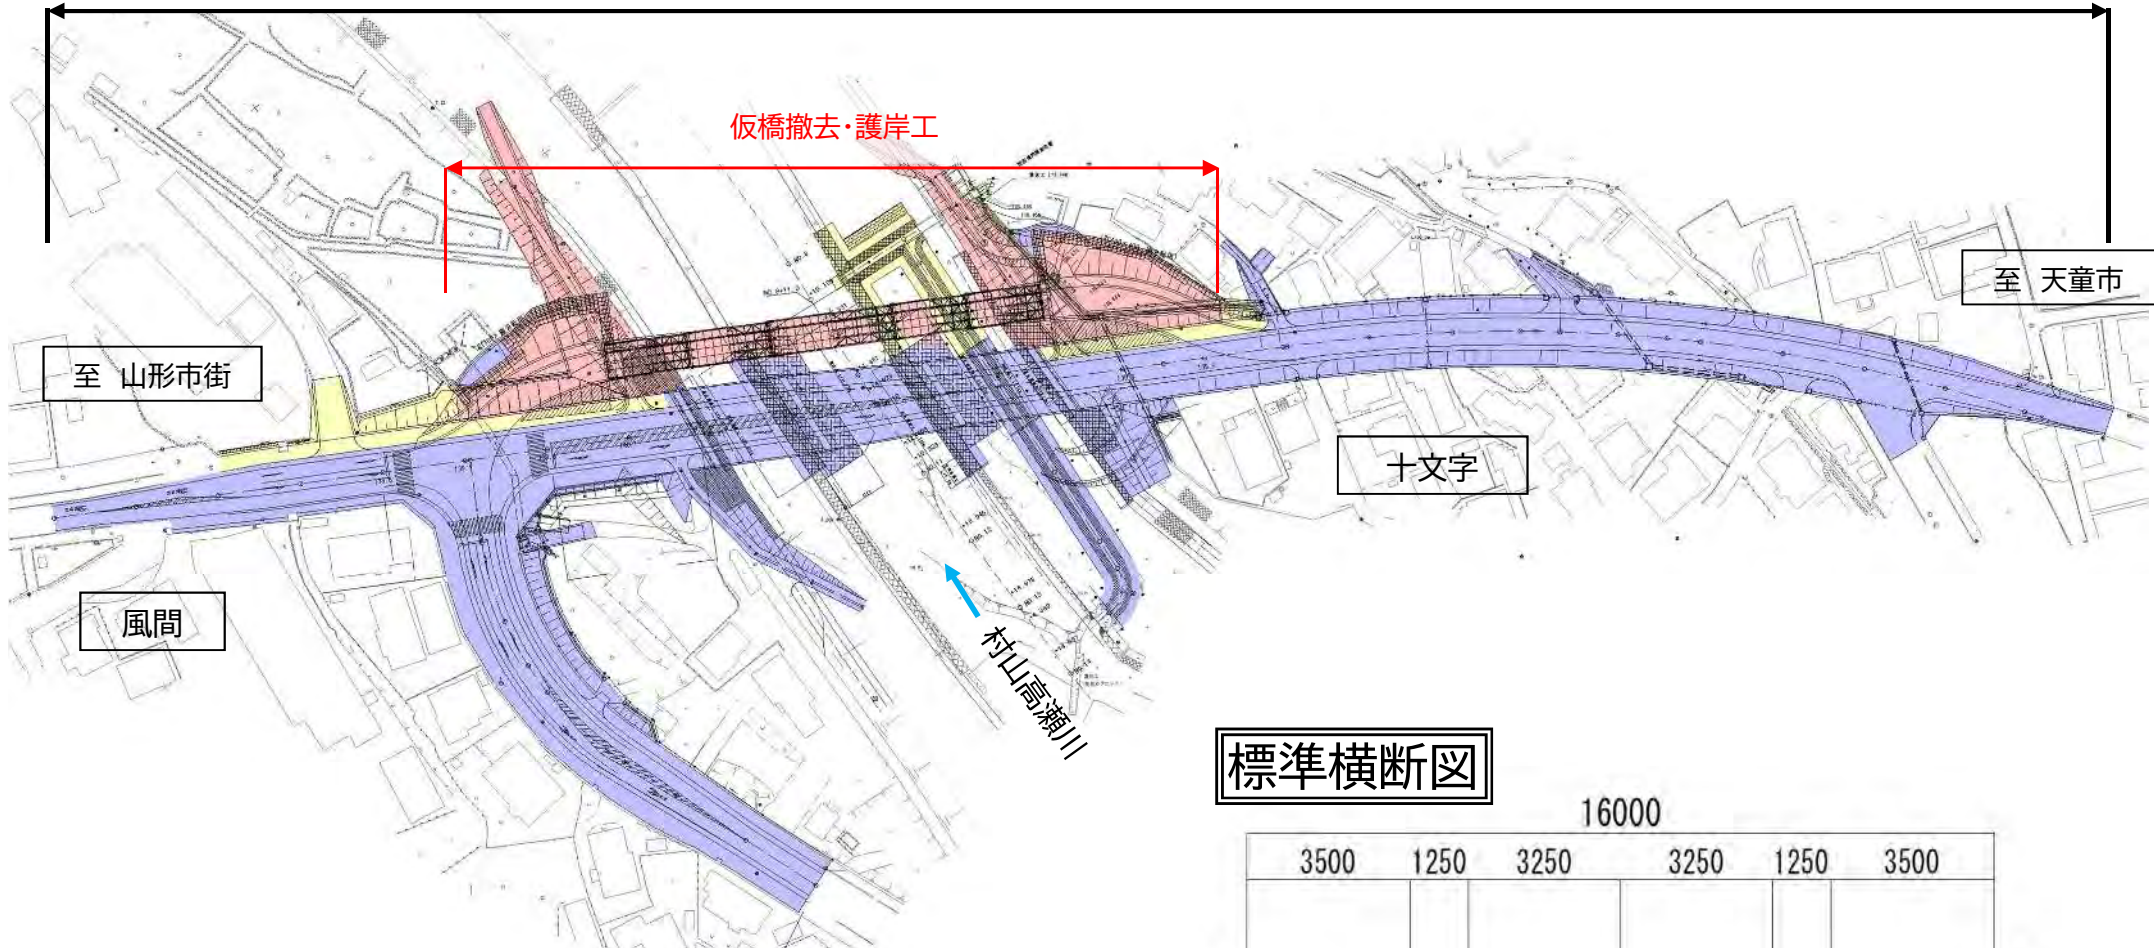

標準横断図

